

INFORME TECNICO
GADOR/SDMMRE/DRM/AASCC/IT N° 11/2024

A : Felipe Huayta Quispe
SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE MINERÍA, METALURGIA Y RECURSOS ENERGÉTICOS

VIA : Ing. Rubén Kapa Ticona
DIRECTOR DE REGALÍAS MINERAS
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MINERÍA, METALURGIA Y RECURSOS ENERGÉTICOS

Ing. Jorge Iván Morales Gutiérrez
ENCARGADO DE AREA DE AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y COBRO
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MINERÍA, METALURGIA Y RECURSOS ENERGÉTICOS

DE : Ing. Raul Montes Isnado
PROFESIONAL TECNICO I – TECNICO EN SISTEMAS Y DESARROLLO

Ing. Edith Trujillano Sarzo
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III – PROFESIONAL SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD

Ing. Ludby Javier Calahuara Yugar
PROFESIONAL TECNICO III – TECNICO EN REGISTRO Y EMISION DE FORMULARIO 101

Ing. Adolfo Rodrigo Soto Arnez
PROFESIONAL TECNICO I – TECNICO EN REGISTRO Y VERIFICACION

REF. : **ENTREGA DE DISEÑO DE BASE DE DATOS SISTEMA SIDCOM V2 SEGÚN CRONOGRAMA**

FECHA : Oruro, 13 de junio de 2024

1. ANTECEDENTES

En fecha 21 de mayo del presente año, en Dirección de regalías mineras se tuvo una reunión con referencia a la elaboración del sistema SIDCOM V2 con la presencia del equipo de Sistemas y Dirección de regalías mineras, el Ing. Rubén Kapa Ticona en su condición de Director de regalías mineras quien menciona *“se debe elaborar un cronograma para la elaboración del sistema SIDCOM V2, quien recomienda que se debe elaborar un Sistema con FRONTEND y BACKEND”*

En fecha 21 de mayo del presente año, el Ing. Jorge Ivan Morales Gutierrez en su condición de Encargado de área de automatización del sistema de control y cobros, deriva Hoja de ruta SDMMRE-878/2024 con referencia *“Presentación el diseño de la Base de datos y su plan de trabajo hasta fecha 27/05/2024 a horas 10:00 am. En coordinación con el Ing. Ludby Javier Calahuara Yugar e Ing. Edith Trujillano Sarzo de acuerdo a reunión entre el personal involucrado en fecha 21/05/2024.*

En fecha 24 de mayo de 2024, se mantuvo una reunión entre los involucrados del desarrollo del Sistema SIDCOM V2 donde se coordinó el plan de trabajo y se elaboró un Cronograma conjunto tanto Frontend y Backend.

En fecha 3 de junio de año en curso el Área de Tecnologías de Información (ATI) del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, presenta Informe A.T.I. - N° 139/2024 en la cual señala (...) *se revisa la solicitud de revisión del cronograma de plazos del nuevo sistema SIDCOM web 2.0, el cual debe realizar la NTEROPERABILIDAD de datos del comercio interno y comercio externo con el sistema integral de administración y control de regalías mineras(..).*

En fecha 6 de junio de año en curso, el Director de Regalías Mineras Ing. Rubén Kapa Ticona emite Memorándum de Instrucción para el desarrollo del sistema SIDCOM en su segunda versión:

Ing. Ludby Javier Calahuara Yugar	Desarrollo Frontend	G.A.D.ORU. /SDMMRE/DRM/MI N°001/2024
Ing. Edith Trujillano Sarzo	Desarrollo Frontend	G.A.D.ORU. /SDMMRE/DRM/MI N°002/2024
Ing. Adolfo Rodrigo Soto Arnez	Desarrollo Backend	G.A.D.ORU. /SDMMRE/DRM/MI N°003/2024
Ing. Raul Montes Isnado	Desarrollo Backend	G.A.D.ORU. /SDMMRE/DRM/MI N° 004/2024
Ing. Ivan Morales Gutierrez	Supervisor	G.A.D.ORU. /SDMMRE/DRM/MI N° 005/2024

En fecha 11 de junio del año en curso, el Ing. Iván Morales Gutiérrez deriva hoja de ruta ATI-319/2024 en la cual señala *“Coordinar con el Ing. Ludby Javier Calahuara Yugar, Ing. Edith Trujillano Sarzo y Ing. Adolfo Rodrigo Soto Arnez, para dar cumplimiento al cronograma establecido para el desarrollo del sistema SIDCOM V2”*.

2. DESARROLLO

Con los miembros involucrados en el desarrollo de sistema SIDCOM V2 se desarrolló una reunión en la cual se determinó el alcance del sistema como ser (maquetación, diagramas, base de datos y otros). En cumplimiento de informe con cite: ATI 139/2024 donde menciona en sus conclusiones inciso e) *“con respecto a la actividad de maqueting se tiene conocimiento por parte del área de automatización de la secretaria de minería que ya existe una estructura ya revisada y finalizada por lo cual se comenzaría de inmediato con el diseño de la base de datos”*.

Se tiene diseñado un modelo de casos de uso presentado anteriormente en el Informe Técnico GADOR/SDMMRE/DRM/AASCC/IT N° 9/2024 mismo se adjunta (ANEXO 1)

Para el diseño de base de datos, se partió del análisis de la base de datos del sistema SIDCOM VERSION 1, considerando que varios de los campos se mantienen en las tablas, se adiciona y/o modifica tablas. Por todo lo expuesto se presenta el siguiente modelo de base de datos para el sistema SIDCOM VERSION 2 (ANEXO 2).

A partir de informe entregada por el Ing. Giancarlo Delgadillo Coca personal del Área de Tecnologías de información con cite: ATI – N° 139/2024 quien plantea un cronograma para el desarrollo del sistema en 60 días hábiles (con una holgura de 10 días hábiles) el mismo empezaba el 5 de junio, como se menciona anteriormente los memorándum fueron emitidos el 6 de junio, en el cual menciona que el inicio del desarrollo del sistema SIDCOM V2 es a partir del 7 de junio y con una finalización del 2 de septiembre, por tal motivo el cronograma presentado por la ATI se recorre dos días (ANEXO 3)


3. CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto anteriormente se concluye que


- Se presenta el Diseño de la base de datos para el sistema SIDCOM VERSION 2, cumpliendo el cronograma propuesto.
- La Base de Datos y diagrama de casos de uso es sujeta a modificación de acuerdo a los cambios que vayan apareciendo al momento de la **Programación (codificación)** del sistema SIDCOM VERSION 2
- Se presenta cronograma actualizado

En cuanto informo a su autoridad para fines consiguientes y tomar las acciones correspondientes.

ANEXO 1: Base de datos SIDCOM VERSION 2

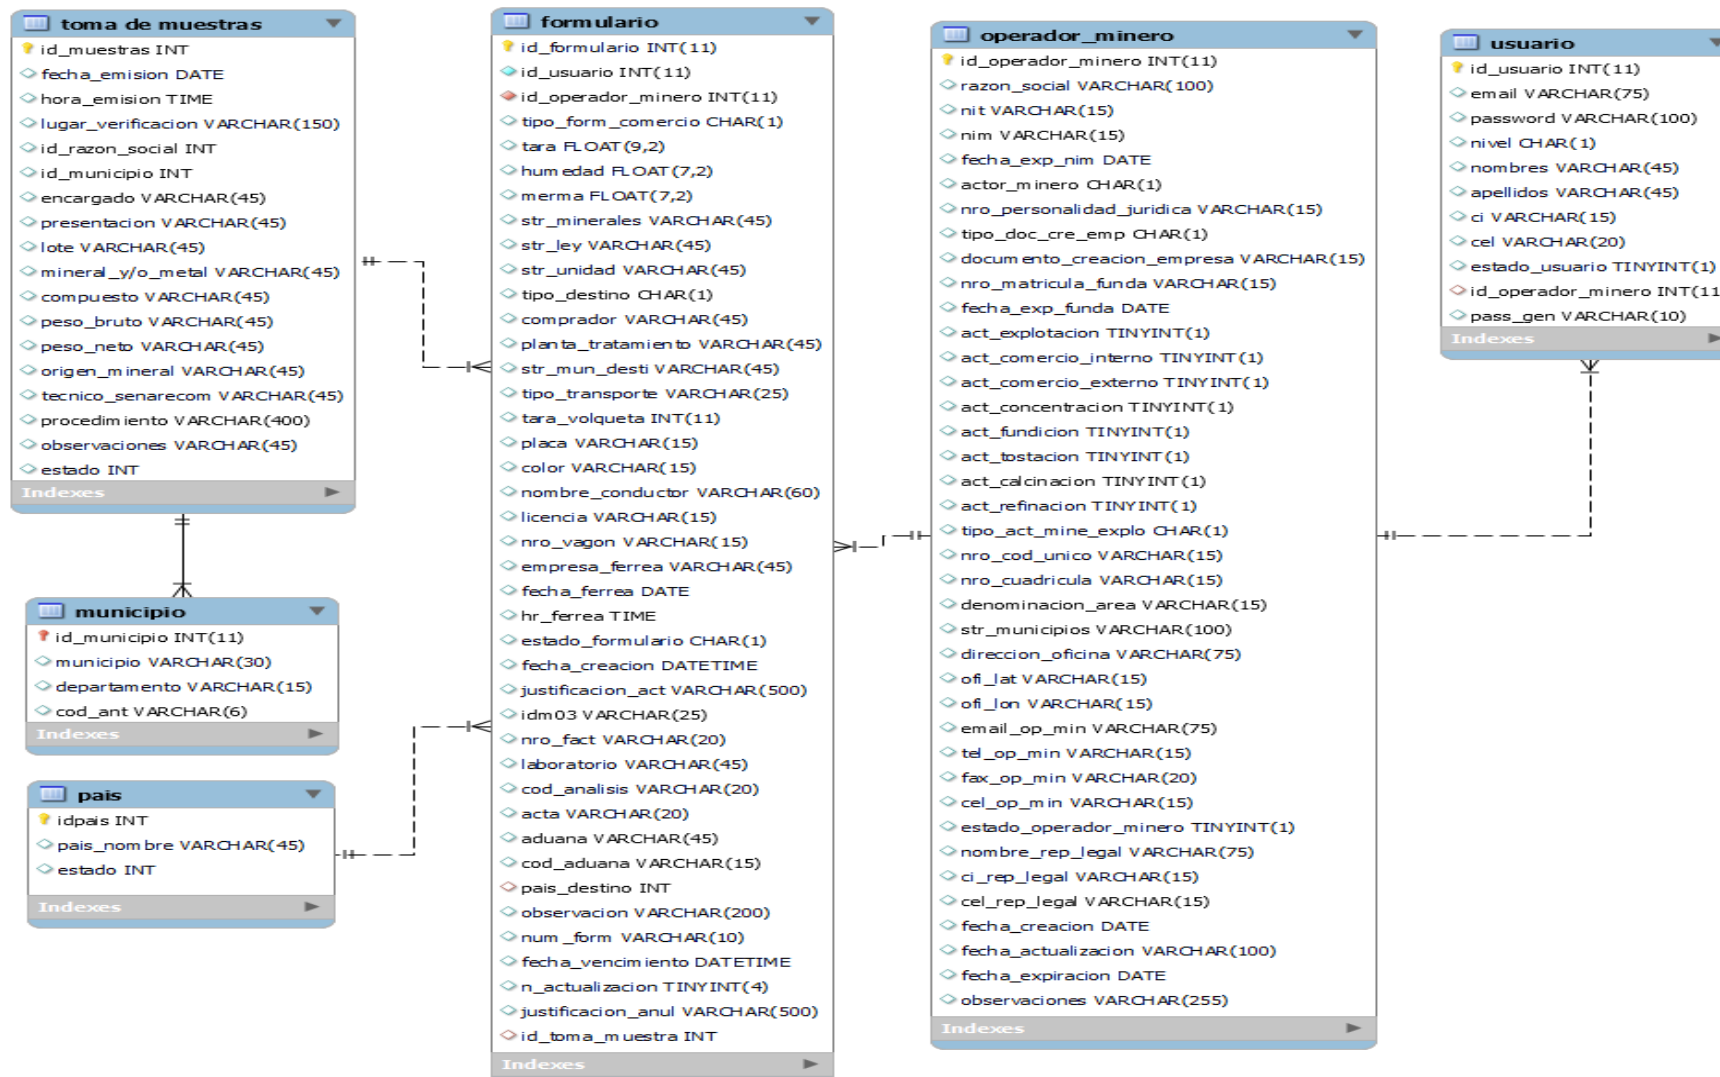

ANEXO 2: DIAGRAMA DE CASOS DE USO

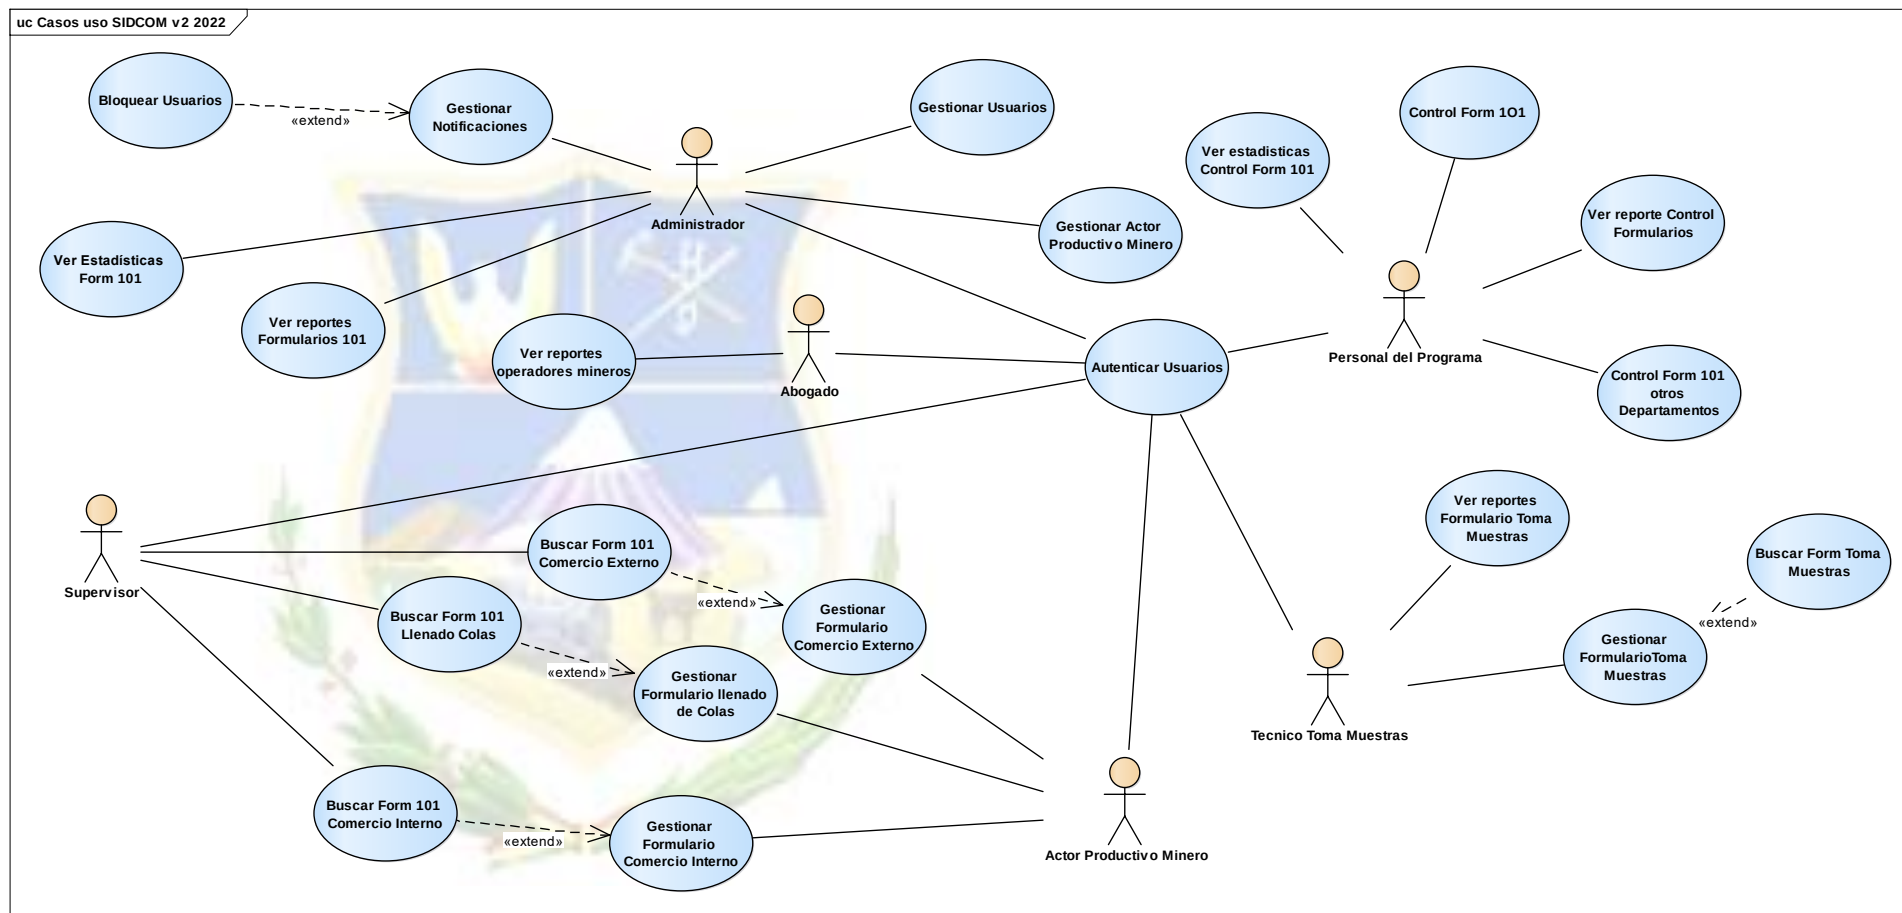

ANEXO 2: CRONOGRAMA ACTUALIZADO

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Non de los	regar nu	jun '24					jul '24				ago '24				sep '24				
							27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9		
Diseño de base de datos	5 días	vie 7/6/24	jue 13/6/24																					
Modulo de Usuarios	10 días	vie 14/6/24	vie 28/6/24																					
Modulo Operadores Mineros	5 días	lun 1/7/24	vie 5/7/24																					
Modulo Toma de muestras	5 días	lun 8/7/24	vie 12/7/24																					
Modulo de comercio interno - externo	15 días	lun 15/7/24	lun 5/8/24																					
modulo cooperativas	5 días	mar 6/8/24	lun 12/8/24																					
modulo reportes	5 días	mar 13/8/24	lun 19/8/24																					
Pruebas, implementacion y evaluacion	10 días	mar 20/8/24	lun 2/9/24																					
